



Zamawiający:

GMINA RZGÓW, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

**„Dostawa i montaż pawilonu szatniowego na boisku w Starowej Górze na ul. Żwirowej” – etap II**

Adres inwestycji:


ul. Żwirowa, miejscowość: Starowa Góra, Gmina Rzgów, powiat łódzki – wschodni, województwo łódzkie

Działki nr 449

Obręb 14 Starowa Góra.

Rzgów, dnia 22.04.2022 r.

Mapa województwa łódzkiego z oznaczonym powiatem łódzkim wschodnim

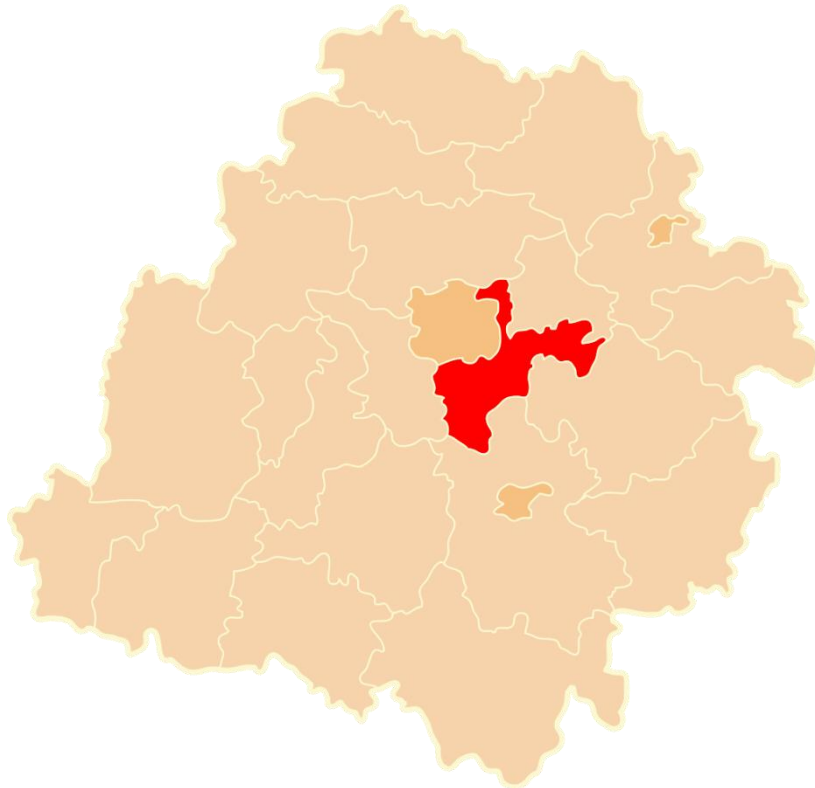

Mapa z rozbiciem na gminy w powiecie łódzkim wschodnim



Szkic lokalizacyjny – Starowa Góra ul. Żwirowa, działka nr 449



---

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem pawilonu kontenerowego, szatniowego na terenie boiska sportowego przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze, gmina Rzgów, w ramach zadania zapisanego w budżecie Gminy Rzgów pod nazwą:  
**„Doposażenie boiska na ul. Żwirowej w Starowej Górze”**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawę oraz montaż na działce nr 449 w miejscowości Starowa Góra, pawilonu kontenerowego szatniowego zawierającego:

- pomieszczenie szatni o powierzchni minimum 12-15m<sup>2</sup>.  
Bezpośrednio z szatni ma być dostępne pomieszczenie sanitarne wyposażone w kabinę natryskową z baterią prysznicową, miskę ustępową (kompakt lub ze stelażem spłukującym) z deską sedesową, oraz umywalkę z baterią umywalkową.  
Powierzchnia zaplecza sanitarnego 6-9m<sup>2</sup>  
W szatni należy zapewnić dostęp do światła dziennego – minimum 1 okno.
- pomieszczenie magazynowe o powierzchni min. 10-15m<sup>2</sup> z oknem

istotne parametry:

- przeznaczenie obiektu: kontener szatniowy z zapleczem sanitarnym
- wysokość obiektu wewnątrz pomieszczeń min 2,40 m,
- kolorystyka obiektu grafitowy RAL 7024
- materiały:

**podłoga:** profile stalowe podłużne i poprzeczne zimnogięte, izolacja z wełny mineralnej lub styropianu o grubości minimum 10cm, płyta MFP, w pomieszczeniach sanitarnych płyta wodoodporna. Wykończenie z wykładziny PCW. Na łączeniu wykładziny ze ścianą listwa PCW w kolorze podłogi.

Uwaga: W pomieszczeniu sanitarnym wykładzina wywinięta na ściany na minimum 10cm  
Dodatkowo pomieszczenia sanitarne mają być wyposażone w kratkę ściekową.

**ściany** z płyty warstwowej z wypełnieniem styropianowym lub z pianki poliuretanowej o grubości min. 10cm w okładzinie z blachy stalowej, ocynkowana malowana proszkowo, kolor od wewnątrz biały lub jasno – szary, od zewnątrz grafitowy RAL 7024

**dach: dwuspadowy o kącie nachylenia max 15°** - wymóg stawiany przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

konstrukcja dachu: profile stalowe zimnogięte, poszycie zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, izolacja z wełny mineralnej o grubości 10-15cm lub z płyt warstwowych z izolacją ze styropianu lub pianki poliuretanowej gr. 10-15cm. Wykończenie od wewnątrz płytą MFP i membraną dachową, alternatywnie płyta laminowana lub blacha gładka lakierowana. Kolor od wewnątrz biały lub jasnoszary.

– dodatkowe elementy wyposażenia:

- 1) instalacja elektryczna z tablicą rozdzielczą, gniazdami wtykowymi (minimum jedno podwójne gniazdo w każdym z pomieszczeń + po jednym do zainstalowanych urządzeń tj. grzejnik, bojler, podgrzewacz) i instalacja oświetlenia wewnętrznego wraz z oprawami.
- 2) instalacja wodna wykonana z rur polipropylenowych, z wyprowadzeniem pod kontenerem. W łazienkach należy zamontować bojler o pojemności 60-100 l zapewniający ciepłą wodę do natrysków i umywalek. Opcjonalnie przy umywalkach zamontować przepływowe podgrzewacze wody lub bojler o poj. 10l.
- 3) instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC z wyprowadzeniem pod kontenerem
- 4) grzejniki elektryczne konwektorowe o mocy od 1,0 do 2,0 kW w każdym pomieszczeniu
- 5) wentylatory elektryczne oraz kratki grawitacyjne w każdym pomieszczeniu
- 6) okna z PVC uchylne lub uchylno – rozwierane (minimum jedno w każdym z pomieszczeń – toalety, szatnie),
- 7) drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe ocieplone wyposażone w samozamykacz, Drzwi wewnętrzne płytowe. Do toalet drzwi z kratką lub podcięciem wentylacyjnym.

Cena oferty ma zawierać:

- Wykonanie obiektu
- Transport na miejsce montażu
- Montaż obiektu wraz z ustawieniem bloczków fundamentowych (w tym praca dźwigu).

#### **Przygotowanie podłoża:**

Zamawiający wykona niwelację terenu wraz z wzmocnieniem podłoża we własnym zakresie. Po stronie Wykonawcy będzie ustawienie pawilonu na bloczkach betonowych.

W terminie 21 od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym lokalizację wyprowadzeń wody, kanalizacji z obiektu oraz lokalizacji tablicy rozdzielczej w celu umożliwienia zamawiającemu prawidłowego przygotowania terenu i doprowadzenia niezbędnych instalacji w terenie.

Gwarancja na dostarczony pawilon kontenerowy oraz elementy wyposażenia minimum 24 miesiące.

**Przedmiot zamówienia stanowi drugi etap inwestycji – dostarczone pawilony mają być spójne pod względem wizualnym, estetycznym i kompatybilne z pawilonem już zainstalowanym na terenie kompleksu.**

Widok pawilonu zrealizowanego w ramach pierwszego etapu inwestycji



Do oferty należy załączyć następujące rysunki umożliwiające ocenę spełnienia wymagań przez oferenta:

1. Rzut
2. Przekrój
3. Elewacje
4. Opis pozwalający zweryfikować postawione wymagania.
